




c_g337.Comune di Parma - Prot. 25/09/2026.0278481.E Documento firmato digitalmente da: Nicola Delmonte con certificato valido dal 23/11/2023 a
l 28/11/2026 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del
D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informativo originale è conservato negli archivi di Comune di Parma



Comune di Parma

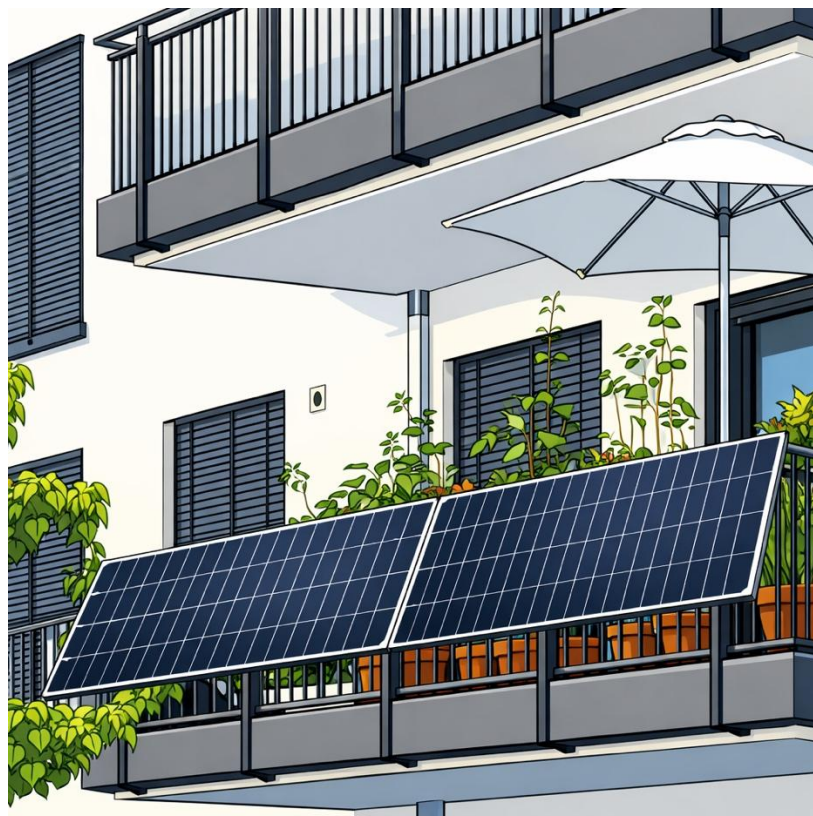

00	Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica			07/09/2026	ND
ZOTech S.r.l. Viale Basetti, 14 43121 - Parma (PR)		 ZOTECH The sound of ideas	Tel. +39 3664113641 www.zotech.it info@zotech.it		
ELABORATO DA: ND		CONTROLLATO: -	APPROVATO: -		
SCALA: -		DATA: 21/09/2026	DOCUMENTO: 005/006	FORMATO A4	Ing. Nicola Delmonte Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma, n. 2394A
COMUNE DI PARMA (PR) PROGETTO: <i>Sistemi fotovoltaici plug-in ad uso domestico - intervento per la partecipazione al Programma di Finanziamento del DM n. 558/2025</i>					 Comune di Parma Documento N. 5
TITOLO: CRONOPROGRAMMA					

Per determinare il cronoprogramma dell'esecuzione dei lavori, in primo luogo, è stato considerato che questi siano svolti in un periodo di un anno. Ciò è utile per stimare per quanti giorni i lavori possano essere interrotti a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Dai database delle condizioni meteorologiche a Parma si contano mediamente circa 88 giorni di pioggia all'anno (considerando i giorni con precipitazioni superiori a 1 mm), mentre i giorni con nevicate significative o accumuli di neve in città sono mediamente scarsi e concentrati in pochissimi giorni (in genere tra i 3 e i 5 giorni all'anno nei periodi più freddi dell'inverno). Per la stesura del cronoprogramma si considererà un numero di giorni complessivo di precipitazioni che possono impedire l'esecuzione di lavori all'aperto pari a 93 giorni e per semplicità sono stati distribuiti uniformemente nei vari mesi dell'anno (circa 8 giorni/mese).

Inoltre, sono state considerati altri giorni in cui non è possibile svolgere attività all'esterno per temperature troppo elevate o troppo basse ($T_{amb} > 35^{\circ}\text{C}$ e $T_{amb} < 5^{\circ}\text{C}$, che a Parma si hanno mediamente per 20 giorni/anno e circa 40 giorni/anno, rispettivamente).

Naturalmente, nell'elaborazione del cronoprogramma sono state considerate le domeniche e altri giorni festivi come giorni da aggiungere a quelli naturali e consecutivi necessari a completare le opere. Altra ipotesi utile a determinare il seguente cronoprogramma è la composizione e la numerosità delle squadre di prestatori d'opera che eventualmente possono operare in parallelo, ovvero contemporaneamente, su più edifici. La squadra tipo considerata per la mera parte di installazione degli impianti è quella di un installatore di 4^a categoria e due installatori di 3^a categoria.

Una squadra così composta, da quanto valutato nel computo metrico estimativo, potrebbe installare mediamente fino a 3 impianti/giorno (2 ore e mezza circa per ogni impianto), ma occorre considerare un fattore di rallentamento dovuto al fatto di dover accedere ad appartamenti abitati a seguito di accordi con gli occupanti. Perciò, si è ritenuto che con questa configurazione di installatori possano essere installati 2 impianti/giorno.

Si prevede che i lavori siano svolti da **tre squadre operanti contemporaneamente**.

Oltre alle lavorazioni di installazione di dispositivi elettrici ed elettronici sono previsti i lavori per l'installazione del cantiere, differente da edificio ad edificio, così come lo è la disinstallazione dello stesso cantiere. Inoltre, prima della installazione dei moduli fotovoltaici in alcuni casi, laddove sono stati riscontrati casi di ammaloramento contenuti, è previsto che siano svolte operazioni di ripristino di parti in cemento e muratura. Quando la balaustra è costituita in parte o in toto in muratura, oltre all'eventuale ripristino, prima di procedere con l'installazione dei moduli fotovoltaici occorrerà eseguire le carotature necessarie per la posa di perni e dadi di ancoraggio.

La sequenza delle attività da svolgere per gli impianti del singolo edificio può esser la seguente:

1. Allestimento cantiere;
2. Eventuali lavori di ripristino di parti murarie ammalorate con: demolizione, pulizia ed

eventuale passivazione, ripristino volumetrico, rasatura e tinteggiatura;

3. Trasporto materiali per la realizzazione degli impianti e supervisione dei singoli appartamenti per individuare dove installare lo smart meter, il quadretto con l'interruttore magnetotermico differenziale, e la presa per la connessione del cavo AC in uscita dall'inverter alla rete elettrica domestica;
4. Installazione con prova di funzionamento degli impianti;
5. Smantellamento cantiere e pulizia.

Nel precedente elenco, l'ammontare delle giornate lavorative per le singole attività previste per ogni edificio ovviamente dipende dal numero di balconi su cui saranno installati gli impianti, dallo stato e dalla tipologia della balaustra dei balconi. In totale si prevede che, al netto delle giornate non lavorative, i lavori possano esser svolti in 300 giorni. Il dettaglio degli edifici con indicazione della tipologia e dello stato dei balconi, nonché del numero di impianti del singolo edificio, del sistema che si prevede possa essere impiegato per lavori in elevazione e il tempo stimato per preparare i balconi ad ospitare i moduli fotovoltaici e il loro montaggio, è esplicito nella tabella seguente.

Indirizzo edificio	Tipologia/stato balconi	Numero impianti	Sistema di elevazione presumibile per eventuali lavori da eseguire in quota con operatori all'esterno dei balconi	Tempo stimato per preparazione balconi (eventuale ripristino e carotature) ¹ compreso montaggio moduli FV [giorni]
Viale I. Cocconi nn. 10, 12, 14	Inferriate con grigliato che non consentono l'installazione dei moduli dall'interno/buono	11	Piattaforma aerea	3
Viale I. Cocconi nn. 11, 13, 15	Inferriate con grigliato che non consentono l'installazione dei moduli dall'interno/buono	19	Piattaforma aerea	4
Viale I. Cocconi nn. 25, 27, 29	Inferriate a barre verticali/buono	17	Non necessario	-
Viale I. Cocconi nn. 26, 28, 30	Inferriate con grigliato che non consentono l'installazione dei moduli dall'interno/buono	21	Piattaforma aerea	5
Via A. Colla 2, 4, 6	Parte alta con inferriata; parte bassa in muratura/2 da risanare	13	Piattaforma aerea	12
Via A. Colla 8, 10, 12	Parte alta con inferriata; parte bassa in muratura/buono	15	Piattaforma aerea	6
Via I. Guareschi 15	Parte alta con inferriata; parte bassa in muratura/2 da risanare	3	Piattaforma aerea	8
Via T. Riboli 12, 14, 16	Inferriate a barre verticali/buono	16	Non necessario	-
Via M. Jacchia 33	Inferriate a barre verticali/da risanare soletta	1	Piattaforma aerea (solo per ripristino)	5
Via Vittorio Bachelet 8, 10	In muratura/buono	10	Piattaforma aerea	8
Via Giuditta Sidoli 31, 33, 35	In muratura/qualche punto da ripristinare	29	Impalcatura fissa	30
Via Giuseppe Pezziol 7	Inferriate a barre	8	Non necessario	-

¹ Incluso l'ancoraggio dei moduli fotovoltaici. Qualora lo stato dei balconi sia buono, solo installazione dei moduli fotovoltaici.



	verticali/buono			
Strada Buffolara 41	Inferriate a barre verticali/buono	5	Non necessario	-
Via Rolando dei Capelluti 40	Inferriate a barre verticali/da risanare	3	Piattaforma aerea	5
Via Erminio e Augusto Olivieri 5	Inferriate a barre verticali/buono	3	Non necessario	-
Via Erminio e Augusto Olivieri 10	Inferriate a barre verticali/buono	1	Non necessario	-
Strada Navetta 15, 17	In muratura/buono	12	Piattaforma aerea	3
Strada Navetta 19, 21	In muratura/buono	15	Piattaforma aerea	4
Strada Navetta 23, 25	In muratura/buono	13	Piattaforma aerea	3
Strada Martinella 287	Inferriate con grigliato/buono	4	Piattaforma aerea	2
Via Monte Gottero 44	Inferriate con grigliato/buono	2	Piattaforma aerea	1
Piazza Vittorio Occorsio 3, 5 e Via Bachelet 12	In muratura/buono	22	Piattaforma aerea	5
Viale dei Mille 2, 54, 56, 58	Inferriate a barre verticali/buono	15	Non necessario	-
Via Alvaro Corrado 4	Mattoni faccia a vista/buono	6	Impalcatura	20
Via Alvaro Corrado 2	Inferriate con vetri/buono	18	Impalcatura	30
Via Domenico Pedretti 7	Cemento armato e muratura/buono	10	Impalcatura	17
Via Jacopo Zanguidi 17, 21	Muratura e grigliato metallico/buono	3	Piattaforma aerea	2
Strada Montanara 20, 22, 24, 26	Inferriate a barre verticali/alcuni da ripristinare bordo soletta	10	Impalcatura/trabattello	14
Via Giuseppe Sbravati 3	Inferriate a barre verticali/buono	3	Non necessario	-
Via Benigno Zaccagnini 1	Mattoni faccia a vista e barre verticali metalliche/buono	3	Impalcatura	7
Via Benigno Zaccagnini 3	Mattoni faccia a vista e barre verticali metalliche/buono	3	Impalcatura	7
Via Aldo Moro 2	Mattoni faccia a vista e barre verticali metalliche/buono	3	Impalcatura	7
Via Aldo Moro 4	Mattoni faccia a vista e barre verticali metalliche/buono	6	Impalcatura	15
Via Lazio 27	Muratura e barre verticali metalliche/buono	14	Piattaforma aerea	7
Via Lazio 29	Muratura e barre verticali metalliche/buono	14	Piattaforma aerea	7
Piazzale Charlie Chaplin 29, 31, 33	Muratura e metallica grigliata/buono quelli in muratura; da ripristinare bordo soletta di alcuni con balaustra metallica	33	Impalcatura/piattaforma aerea	30
Via Caio Valerio Catullo 6,8, 10	Muratura e barre metalliche/alcuni da ristrutturare	14	Impalcatura/piattaforma aerea	21
Via Caio Valerio Catullo 9	Muratura e barre metalliche/buono	3	Impalcatura	7
Via Pozzuolo del Friuli 13	Muratura e barre metalliche/da tinteggiare; alcuni richiedono piccolo ripristino	12	Impalcatura	21
Via Rudolf Jacobs 3	Inferriate a barre verticali/buono	21	Non necessario	-
Via Irma ed Emma Gramatica 2	Mattoni faccia a vista/buono	8	Impalcatura	21
Via Lodovico Gambarà 14, 16	Inferriate a barre verticali/buono	6	Non necessario	-
Stradello Mirko Andreoli 2, 4, 6	Muratura e barre metalliche/buono	28	Piattaforma aerea	14
Via Veronica Biancardi 12, 14	Inferriate a barre verticali/buono	16	Non necessario	-



Via Sette Martiri 2	Inferriate a barre verticali/buono	6	Non necessario	-
---------------------	------------------------------------	---	----------------	---

Il diagramma di Gantt a seguire, suddiviso edificio per edificio, non include i giorni in cui si prevede che non siano svolte attività lavorative.

A seguire si riporta il Gantt che riassume le tempistiche dell'intero progetto indicando il periodo delle lavorazioni al lordo di festività e giorni di interruzione per condizioni meteo avverse.

c_9337.Comune di Parma - Prot. 25/09/2026.0278481.E Documento firmato digitalmente da: Nicola Delmonte con certificato valido dal 23/11/2023 al 28/11/2026 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma



Fasi di cantiere	Tipo	Durata (gg)	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9
Viale I. Cocconi nn. 10, 12, 14											
Allestimento cantiere e preparazione balconi	CANT.	1	1								
Preparazione balaustra e montaggio moduli	OP. CIVIL	3	1	1	1						
Installazione impianti	ELETTR.	5		1	1	1	1	1			
Smatellamento cantiere	CANT.	1					1				
Viale I. Cocconi nn. 11, 13, 15											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Preparazione balaustra e montaggio moduli	OP. CIVIL	4	1	1	1	1					
Installazione impianti	ELETTR.	9		1	1	1	1	1	1	1	1
Smatellamento cantiere	CANT.	1									1
Viale I. Cocconi nn. 25, 27, 29											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Installazione impianti	ELETTR.	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Smatellamento cantiere	CANT.	1									1
Viale I. Cocconi nn. 26, 28, 30											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Preparazione balaustra e montaggio moduli	OP. CIVIL	5	1	1	1	1	1				
Installazione impianti	ELETTR.	10		1	1	1	1	1	1	1	1
Smatellamento cantiere	CANT.	1									1
Via A. Colla 2, 4, 6											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Ripristino e preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVIL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Installazione impianti	ELETTR.	6					1	1	1	1	1
Smatellamento cantiere	CANT.	1									1
Via A. Colla 8, 10, 12											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVIL	6	1	1	1	1	1				
Installazione impianti	ELETTR.	7			1	1	1	1	1	1	1
Smatellamento cantiere	CANT.	1									1
Via I. Guareschi 15											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Ripristino e preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVIL	8	1	1	1	1	1	1			
Installazione impianti	ELETTR.	2					1	1			
Smatellamento cantiere	CANT.	1									1
Via T. Riboli 14, 16											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Installazione impianti	ELETTR.	8	1	1	1	1	1	1	1		
Smatellamento cantiere	CANT.	1									1
Via M. Jacchia 33											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Ripristino e preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVIL	5	1	1	1	1	1				
Installazione impianti	ELETTR.	1					1				
Smatellamento cantiere	CANT.	1						1			
Via Vittorio Bachelet 8, 10											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVIL	8	1	1	1	1	1	1			
Installazione impianti	ELETTR.	5					1	1	1	1	1
Smatellamento cantiere	CANT.	1									1
Via Giuditta Sidoli 31, 33, 35											
Allestimento cantiere	CANT.	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ripristino e preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVIL	10				1	1	1	1	1	1
Installazione impianti	ELETTR.	15					1	1	1	1	1
Smatellamento cantiere	CANT.	0								1	1
Via Giuseppe Pezzoli 7											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Installazione impianti	ELETTR.	4	1	1	1	1					
Smatellamento cantiere	CANT.	1						1			
Strada Buffolara 41											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Installazione impianti	ELETTR.	3	1	1	1						
Smatellamento cantiere	CANT.	1									1
Via Rolando dei Capelluti 40											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Ripristino balconi e montaggio moduli	OP. CIVIL	5	1	1	1	1	1				
Installazione impianti	ELETTR.	1					1				
Smatellamento cantiere	CANT.	1							1		
Via Erminio e Augusto Olivieri 5											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Installazione impianti	ELETTR.	1		1							
Smatellamento cantiere	CANT.	1						1			
Via Erminio e Augusto Olivieri 10											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Installazione impianti	ELETTR.	1		1							
Smatellamento cantiere	CANT.	1							1		
Strada Navetta 15, 17											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVIL	3	1	1	1						
Installazione impianti	ELETTR.	6			1	1	1	1	1	1	1
Smatellamento cantiere	CANT.	1									1

Fasi di cantiere	Tipo	Durata (gg)	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9
Strada Navetta 19, 21											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVILI	4	1	1	1	1					
Installazione impianti	ELETTR.	7		1	1	1	1	1	1	1	
Smatellamento cantiere	CANT.	1									1
Strada Navetta 23, 25											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVILI	3	1	1	1						
Installazione impianti	ELETTR.	7		1	1	1	1	1	1	1	
Smatellamento cantiere	CANT.	1									1
Strada Martinella 287											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVILI	2	1	1							
Installazione impianti	ELETTR.	2		1	1						
Smatellamento cantiere	CANT.	1				1					
Via Monte Gottero 44											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVILI	1		1							
Installazione impianti	ELETTR.	1			1						
Smatellamento cantiere	CANT.	1				1					
Piazza Vittorio Occorsio 3, 5 e Via Bachelet 12											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVILI	5	1	1	1	1	1				
Installazione impianti	ELETTR.	10		1	1	1	1	1	1	1	1
Smatellamento cantiere	CANT.	1									1
Viale del Mille 2, 54, 56, 58											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Installazione impianti	ELETTR.	7	1	1	1	1	1	1	1	1	
Smatellamento cantiere	CANT.	1									1
Via Alvaro Corrado 2, 4											
Allestimento cantiere	CANT.	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVILI	11				1	1	1	1	1	1
Installazione impianti	ELETTR.	12				1	1	1		1	1
Smatellamento cantiere	CANT.	12				1	1	1	1	1	1
Via Domenico Pedretti 7											
Allestimento cantiere	CANT.	7	1	1	1	1	1	1	1	1	
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVILI	3				1	1	1			
Installazione impianti	ELETTR.	5				1	1	1	1	1	
Smatellamento cantiere	CANT.	7					1	1	1	1	1
Via Jacopo Zanguidi 17, 21											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVILI	2	1	1							
Installazione impianti	ELETTR.	2			1	1					
Smatellamento cantiere	CANT.	1				1					
Strada Montanara 20, 22, 24, 26											
Allestimento cantiere	CANT.	4	1	1	1	1					
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVILI	6			1	1	1	1	1		
Installazione impianti	ELETTR.	4				1	1	1	1		
Smatellamento cantiere	CANT.	4					1	1	1	1	
Via Giuseppe Sbravati 3											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Installazione impianti	ELETTR.	2		1	1						
Smatellamento cantiere	CANT.	1			1						
Via Benigno Zaccagnini 1											
Allestimento cantiere	CANT.	3	1	1	1						
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVILI	2			1	1					
Installazione impianti	ELETTR.	2				1	1				
Smatellamento cantiere	CANT.	2					1	1			
Via Benigno Zaccagnini 3											
Allestimento cantiere	CANT.	3	1	1	1						
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVILI	2			1	1					
Installazione impianti	ELETTR.	2				1	1				
Smatellamento cantiere	CANT.	2					1	1			
Via Aldo Moro 2											
Allestimento cantiere	CANT.	3	1	1	1						
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVILI	2			1	1					
Installazione impianti	ELETTR.	2				1	1				
Smatellamento cantiere	CANT.	2					1	1			
Via Aldo Moro 4											
Allestimento cantiere	CANT.	5	1	1	1	1	1				
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVILI	4			1	1	1	1			
Installazione impianti	ELETTR.	3				1	1	1			
Smatellamento cantiere	CANT.	6					1	1	1	1	1
Via Lazio 27											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVILI	6	1	1	1	1	1	1			
Installazione impianti	ELETTR.	7			1	1	1	1	1	1	1
Smatellamento cantiere	CANT.	1									1



Fasi di cantiere	Tipo	Durata (gg)	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9
Via Lazio 29											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVIL	6	1	1	1	1	1				
Installazione impianti	ELETTR.	7		1	1	1	1	1	1		
Smatellamento cantiere	CANT.	1				1					
Piazzale Charlie Chaplin 29, 31, 33											
Allestimento cantiere	CANT.	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ripristino e preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVIL	9		1	1	1	1	1	1	1	1
Installazione impianti	ELETTR.	17				1	1	1	1	1	1
Smatellamento cantiere	CANT.	10			1	1	1	1	1	1	1
Via Caio Valerio Catullo 6, 8, 10											
Allestimento cantiere	CANT.	7	1	1	1	1	1				
Ripristino e preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVIL	7		1	1	1	1	1			
Installazione impianti	ELETTR.	7			1	1	1	1	1		
Smatellamento cantiere	CANT.	7					1	1	1	1	1
Via Caio Valerio Catullo 9											
Allestimento cantiere	CANT.	4	1	1	1	1					
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVIL	3		1	1	1					
Installazione impianti	ELETTR.	2			1	1					
Smatellamento cantiere	CANT.	3				1	1	1			
Via Pozzuolo del Friuli 13											
Allestimento cantiere	CANT.	6	1	1	1	1	1				
Ripristino e preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVIL	9		1	1	1	1	1	1	1	1
Installazione impianti	ELETTR.	6				1	1	1	1	1	1
Smatellamento cantiere	CANT.	6					1	1	1	1	1
Via Rudolf Jacobs 3											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Installazione impianti	ELETTR.	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Smatellamento cantiere	CANT.	1							1		
Via Irma ed Emma Gramatica 2											
Allestimento cantiere	CANT.	9	1	1	1	1	1	1	1		
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVIL	3			1	1	1				
Installazione impianti	ELETTR.	4				1	1	1	1		
Smatellamento cantiere	CANT.	9					1	1	1	1	1
Via Lodovico Gambara 14, 16											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Installazione impianti	ELETTR.	3		1	1	1					
Smatellamento cantiere	CANT.	1		1							
Stradello Mirko Andreoli 2, 4, 6											
Allestimento cantiere	CANT.	2	1	1							
Preparazione balconi e montaggio moduli	OP. CIVIL	10		1	1	1	1	1	1	1	1
Installazione impianti	ELETTR.	14				1	1	1	1	1	1
Smatellamento cantiere	CANT.	2								1	1
Via Veronica Biancardi 12, 14											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Installazione impianti	ELETTR.	8	1	1	1	1	1	1	1		
Smatellamento cantiere	CANT.	1							1		
Via Sette Martiri 2											
Allestimento cantiere	CANT.	1	1								
Installazione impianti	ELETTR.	3		1	1	1					
Smatellamento cantiere	CANT.	1			1						



Attività	Tipo	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14	M 15	M 16	M 17	M 18	M 19	M 20	M 21	M 22	M 23	M 24
Progettazione esecutiva	Progettuale																								
Affidamento forniture ed esecuzione lavori	Amministrativo																								
Fornitura, allestimento cantieri, installazione impianti con opere accessorie, smantellamento cantieri	Esecuzione lavori																								
Visite e redazione relazione di collaudo tecnico/amministrativo	Tecnico-amministrativo																								
