




COMUNE DI PARMA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

responsabile del procedimento
GEOM. MARCO FERRARI

progetto generale
GEOM. MARCO FERRARI

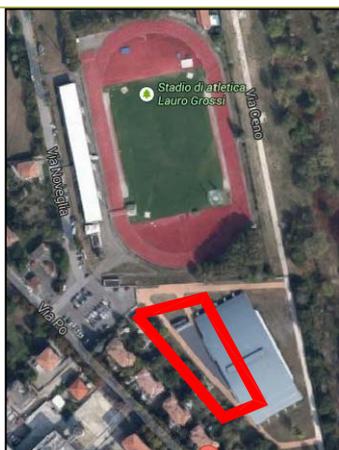

coordinatore della sicurezza
ING. PAOLO GIOVANELLI

Interventi di manutenzione straordinaria

IMPIANTO DI ATLETICA SPORTIVA "PALA LOTTICI" PARMA

Primi interventi di manutenzione straordinaria necessari a ridare funzionalità all'impianto a seguito dell'esondazione del Torrente Baganza del 13 ottobre 2014

revisione	data	descrizione	redatto da:	controllato da:	approvato da:
01	15.12.2014	emissione elaborato		Geom. M. Ferrari	Geom. M. Ferrari
02					
03					
04					
05					
06					

PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TAVOLA:

serie numero

C.PR 01

formato

-

scala

file:

PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI, AI SENSI DEL PUNTO 2.3.1 DELL'ALLEGATO XV AL D. LGS. 81/2008 E SS. MM. II.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Lavorazione	gg.	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4						
		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
FASI																													
ALLESTIMENTO CANTIERE																													
posa recinzione di cantiere	1																												
baraccamenti - logistica - viabilità	1																												
impianto elettrico di cantiere	1																												
delimitazione aree stoccaggio	1																												
Totale	1																												
IMPIANTO ELETTRICO																													
revisione impianto elettrico forza motrice	3																												
revisione impianto elettrico illuminazione	3																												
collaudo e certificazione conformità impianto elettrico	1																												
Totale	6																												
IMPIANTO TERMOIDRAULICO																													
pulizia e spurgo impianto di scarico	3																												
revisione impianto termoidraulico	1																												
collaudo e certificazione conformità impianto termoidraulico	1																												
Totale	6																												
OPERE MURARIE																													
spazzolatura intonaci	2																												
ripresa localizzata intonaci	1																												
Totale	2																												
TINTEGGI																													
preparazione superfici da tinteggiare	2																												
tinteggiatura	2																												
Totale	6																												
SMANTELLAMENTO CANTIERE, PULIZIE FINALI																													
finiture	2																												
Smobilizzo cantiere	1																												
Totale	3																												

INIZIO LAVORI

INIZIO LAVORI
