COMMITTENTE:


Comune di Parma

PROGETTO:

TEATRO REGIO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE

CUP I96C22000120004

CUI L00162210348202300066

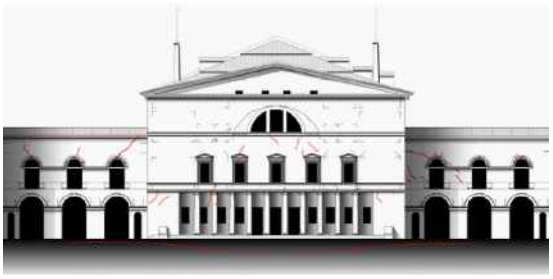

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO:

CRONOPROGRAMMA

CODICE: I23-099

TAVOLA: PSC.03

DATA: OTTOBRE 2025

SCALA:

REVISIONI:

1 FEBBRAIO 2026
2 MARZO 2026
3 OTTOBRE 2026
4

COORDINATORE DELLA SICUREZZA:

arch. Matteo Citterio

Studio Ar.Tec ingegneria e architettura s.r.l.
viale Po 136/a - 43125 parma
tel 0521 292918 fax 0521 290195
studio@studioartecsrl.it

RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE VIETATA A TERMINI DI LEGGE

CRONOPROGRAMMA

ATTIVITA'	1° settimana 25-gen-27	2° settimana 1-feb-27	3° settimana 8-feb-27	4° settimana 15-feb-27	5° settimana 22-feb-27	6° settimana 1-mar-27	7° settimana 8-mar-27	8° settimana 15-mar-27	9° settimana 22-mar-27	10° settimana 29-mar-27	11° settimana 5-apr-27	12° settimana 12-apr-27	13° settimana 19-apr-27	14° settimana 26-apr-27	15° settimana 3-mag-27	16° settimana 10-mag-27	Fine Attività Teatro	17° settimana 17-mag-27	18° settimana 24-mag-27	19° settimana 31-mag-27	20° settimana 7-giu-27	21° settimana 14-giu-27	22° settimana 21-giu-27	23° settimana 28-giu-27	24° settimana 5-lug-27	25° settimana 12-lug-27	26° settimana 19-lug-27	27° settimana 26-lug-27	28° settimana 2-ago-27	29° settimana 9-ago-27	30° settimana 16-ago-27	31° settimana 23-ago-27	32° settimana 30-ago-27	inizio Attività Teatro	42° settimana 8-nov-27	43° settimana 15-nov-27	44° settimana 22-nov-27	45° settimana 29-nov-27
Periodo complessivo appalto																																						
Fornitura materiale/Installazione cantiere																																						
Esecuzione effettiva delle lavorazioni senza limitazioni																																						
Esecuzione effettiva delle lavorazioni con limitazioni																																						
Installazione cantiere																																						
Opere di consolidamento foyer																																						
Opere di realizzazione tirantature																																						
Opere di consolidamento archi torrette parafulmini																																						
Opere di consolidmaneto archi alcova																																						
Opere di realizzazione trave reticolare orizzontale																																						
Opere di restauro interne																																						
Opere di restauro esterne																																						
Rimozione cantiere																																						

Scadenza intermedia 01

Completamento rilievi

Scadenza intermedia 02

Completamento costruttivi ed invio ordini

Scadenza intermedia 03

Inizio lavori in cantiere

Scadenza intermedia 04

Fine lavori a meno delle opere di restauro

L'inizio dei tempi contrattuali cominceranno presumibilmente dal 25 gennaio 2027 e la ditta avrà a disposizione un periodo di circa 14 settiman per procedere all'analisi dello stato dei luoghi, rilievi di dettaglio ed ordine dei materiali utili all'appalto. I lavori dovranno essere terminati tassativamente entro il 27 novembre 2027

Dal 17 maggio 2027 al 28 agosto 2027 e dal 8 novembre 27 novembre tutti i locali del teatro saranno liberi e gli addetti potranno accedervi liberamente.

a) dal 03/05/2027 al 17/05/2027 potrebbero iniziare le lavorazioni nel Ridotto, nella sala Gandolfi e nella zona Uffici (per intervento parafulmini) compatibilmente con le attività previste nei suddetti spazi, con tempistiche e modalità da concordare congiuntamente ai referenti del Teatro Regio;
b) dal 17/05/2027 al 21/08/2027 dovranno concludersi i lavori di alcova, palco e foyer;
c) dal 21/08/2027 al 28/08/2027 dovranno concludersi i lavori descritti al punto a);
d) dal 28/08/2027 al 27/11/2027 termineranno i lavori di restauro ovviamente compatibilmente con le attività presenti.

d1) all'interno della finestra temporale 28/08/2027 - 27/11/2027 l'ipotetica suddivisione delle opere di restauro interne sulla base dell'attuale programmazione dell'attività tratrale è così distrubuita: conclusione di eventuali lavori di restauro interni nel Ridotto e nel Foyer dal 28/08/2027 al 10/09/2027, conclusione di eventuali lavori di restauro interni in alcova dal 24/10/2027 a 30/10/2027, conclusione di eventuali lavori di restauro interni in sala Gandolfi dal 24/10/2027 al 27/11/2027,

NOTA BENE: DATE DA CONFERMARE CON I TECNICI E RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' TEATRALI
